



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia



Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

Elaborati Planimetrici

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa



COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE



TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI



ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento ARCHITECNA ENGINEERING s.r.l. 	Studio architettonico e paesaggistico STUDIO ROSSIPRODI 	Studio trasportistico ALEPH s.r.l. 	Studio ambientale AMBIENTE s.p.a. 	Archeologia COOPERATIVA ARCHEOLOGIA 
Progettazione SDA PROGETTI 	Aspetti strutturali ponti STUDIO MATILDI+PARTNERS 	Impianti STUDIO GAROFALO&TORTORELLA 	Geologia GEODINAMICA 	Idraulica HYDROGEO INGEGNERIA 

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
	FL32	PD	CAN	SK002	0B	-	FL3.2-PD-CAN-SK-002-0B.dwg

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Dicembre 2018	Prima Emissione	Baglivo	Astorino	Caminiti
0B	Settembre 2019	Emissione a seguito di Conferenza dei Servizi	Menchetti	Astorino	Caminiti
0C					

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 1

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.
Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 2

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE









Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.
Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 3

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.
Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.
Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 4

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.

Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna.

Cantiere G1









Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.

Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 5

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.

Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna.

Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.

Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 6

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.

Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna.

Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.

Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 7

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.

Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna.

Cantiere G1









Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.

Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 8

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere C2

Eliminazione del bypass Viale Amendola-Viale Giovine Italia all'ingresso di Piazza Beccaria.

Viabilità alternativa individuata: realizzazione preventiva di un bypass semaforizzato in Piazza Beccaria per permettere l'inversione di marcia.

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna.

Cantiere G1









Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.

Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controviale di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 9

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello.
Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere F3

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Firenze.
Viabilità alternativa individuata: Via Erbosa - Via Villamagna - Piazza Ravenna..









Cantiere G1

Viabilità parzialmente interdetta lungo Viale Europa: in direzione Bagno a Ripoli nel tratto Via Svezia - Via Danimarca, in direzione Centro nel tratto Via San Marino - Largo Novello.
Viabilità alternativa individuata: in direzione Bagno a Ripoli si percorre l'itinerario Via Svezia - Via Finlandia - Via Irlanda - Via Norvegia - Via Danimarca. In direzione Centro si percorre Via Ungheria, che funge da controvia di Viale Europa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 10

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).









Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 11

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).









Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 12

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).









Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 13

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 14

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).









Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 15

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro. Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.









Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord. Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna. La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 16

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in entrambe le direzioni.

Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.

Cantiere F4

Viabilità interdetta lungo Viale Giannotti in direzione Centro.

Viabilità alternativa individuata: Largo Novello - Via D'Antiochia - Via Datini - Via Traversari. Sarà consentito l'attraversamento di Viale Giannotti lungo l'asse Via del Paradiso - Via Erbosa.

Cantiere G2









Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord. Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.

La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 17

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello.
Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in entrambe le direzioni.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.









Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa provenendo dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, provenendo da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 18

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello. Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in entrambe le direzioni. Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.

Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord. Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna. La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 19

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere B2

Interdetti gli attraversamenti trasversali in Piazzale Donatello.
Viabilità alternativa individuata: posizionamento di un semaforo in Viale Gramsci che consenta la svolta in Viale Mazzini, permettendo l'attraversamento dei viali o l'inversione del senso di marcia (itinerario Viale Gramsci-Via Segni).

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in entrambe le direzioni.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.









Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 20

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in direzione Firenze.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.









Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 21

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere E

Viabilità interdetta lungo il Ponte da Verrazzano in direzione Firenze.

Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte carrabile aperto al traffico, raggiungibile da Lungarno Colombo, Lungarno Aldo Moro e da Via Villamagna.

Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.

La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 22

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa proveniente dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, proveniente da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 23

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Diretrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Diretrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere A

Interdetta la circolazione in Viale Don Minzoni direzione Piazza della Libertà nel tratto Via Pascoli - Piazza Libertà.
Viabilità alternativa individuata: Via Pascoli - Via Mafalda di Savoia - Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà.

Cantiere F1

Interdetta la circolazione in Via Poggio Bracciolini in direzione Firenze.
Viabilità alternativa individuata: Via Adriani - Via Villamagni- Piazza Ravenna.
Durante le fasi di cantiere è consentito il transito da Via Villamagna a Lungarno Ferrucci e da Via Coluccio Salutati a Via Adriani.

Cantiere F2

Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Firenze nel tratto Piazza Gavinana - Via B. Scala. Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Gavinana nel tratto Via Accolti - Via B. Scala.
Viabilità alternativa individuata per chi proviene da Viale Giannotti: Via Scala - Via di Ripoli - Via Accolti.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte di Via Villamagna.
Chi proviene da Bagno a Ripoli percorre l'itinerario Via Caponsacchi - Piazza Guaffredotto - Via Lapo da Castiglionchio per poi percorrere il nuovo ponte o immettersi in Via Villamagna.

Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa provenendo dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, provenendo da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 24

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere A

Interdetta la circolazione in Viale Don Minzoni direzione Piazza della Libertà nel tratto Via Pascoli - Piazza Libertà.
Viabilità alternativa individuata: Via Pascoli - Via Mafalda di Savoia - Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà.

Cantiere F1

Interdetta la circolazione in Via Poggio Bracciolini in direzione Firenze.
Viabilità alternativa individuata: Via Adriani - Via Villamagni- Piazza Ravenna.
Durante le fasi di cantiere è consentito il transito da Via Villamagna a Lungarno Ferrucci e da Via Coluccio Salutati a Via Adriani.

Cantiere F2

Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Firenze nel tratto Piazza Gavinana - Via B. Scala. Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Gavinana nel tratto Via Accolti - Via B. Scala.
Viabilità alternativa individuata per chi proviene da Viale Giannotti: Via Scala - Via di Ripoli - Via Accolti.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte di Via Villamagna.
Chi proviene da Bagno a Ripoli percorre l'itinerario Via Caponsacchi - Piazza Guaffredotto - Via Lapo da Castiglionchio per poi percorrere il nuovo ponte o immettersi in Via Villamagna.









Cantiere G2

Interdetta la svolta da Viale Europa provenendo dal Centro per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Nord.
Viabilità alternativa individuata: Via del Cimitero del Pino - Via Grecia - Via Spagna.
La svolta per la rampa del Viadotto Marco Polo in direzione Autostrada, provenendo da Bagno a Ripoli è sempre consentita attraverso la realizzazione di un semaforo.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 25

LEGENDA

-  Cantiere in lavorazione: Opere Civili e Armamento
-  Cantiere in lavorazione: Finiture Opere Civili e Impianti
-  Lavorazioni completate
-  Cantiere non iniziato
-  Diretrici di viabilità pubblica garantite in fase di cantiere
-  Diretrici di viabilità pubblica chiuse in fase di cantiere
-  Percorsi alternativi individuati con senso di marcia non modificato
-  Percorsi alternativi individuati con inversione senso di marcia o nuova viabilità

NOTE

Cantiere A

Interdetta la circolazione in Viale Don Minzoni direzione Piazza della Libertà nel tratto Via Pascoli - Piazza Libertà.
Viabilità alternativa individuata: Via Pascoli - Via Mafalda di Savoia - Via del Ponte Rosso - Piazza della Libertà.

Cantiere F1

Interdetta la circolazione in Via Poggio Bracciolini in direzione Firenze.
Viabilità alternativa individuata: Via Adriani - Via Villamagni- Piazza Ravenna.
Durante le fasi di cantiere è consentito il transito da Via Villamagna a Lungarno Ferrucci e da Via Coluccio Salutati a Via Adriani.

Cantiere F2


Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Firenze nel tratto Piazza Gavinana - Via B. Scala. Interdetta la circolazione in Viale Giannotti in direzione Gavinana nel tratto Via Accolti - Via B. Scala.
Viabilità alternativa individuata per chi proviene da Viale Giannotti: Via Scala - Via di Ripoli - Via Accolti.
Viabilità alternativa individuata: nuovo ponte di Via Villamagna.
Chi proviene da Bagno a Ripoli percorre l'itinerario Via Caponsacchi - Piazza Gualfredotto - Via Lapo da Castiglionchio per poi percorrere il nuovo ponte o immettersi in Via Villamagna.

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 26

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

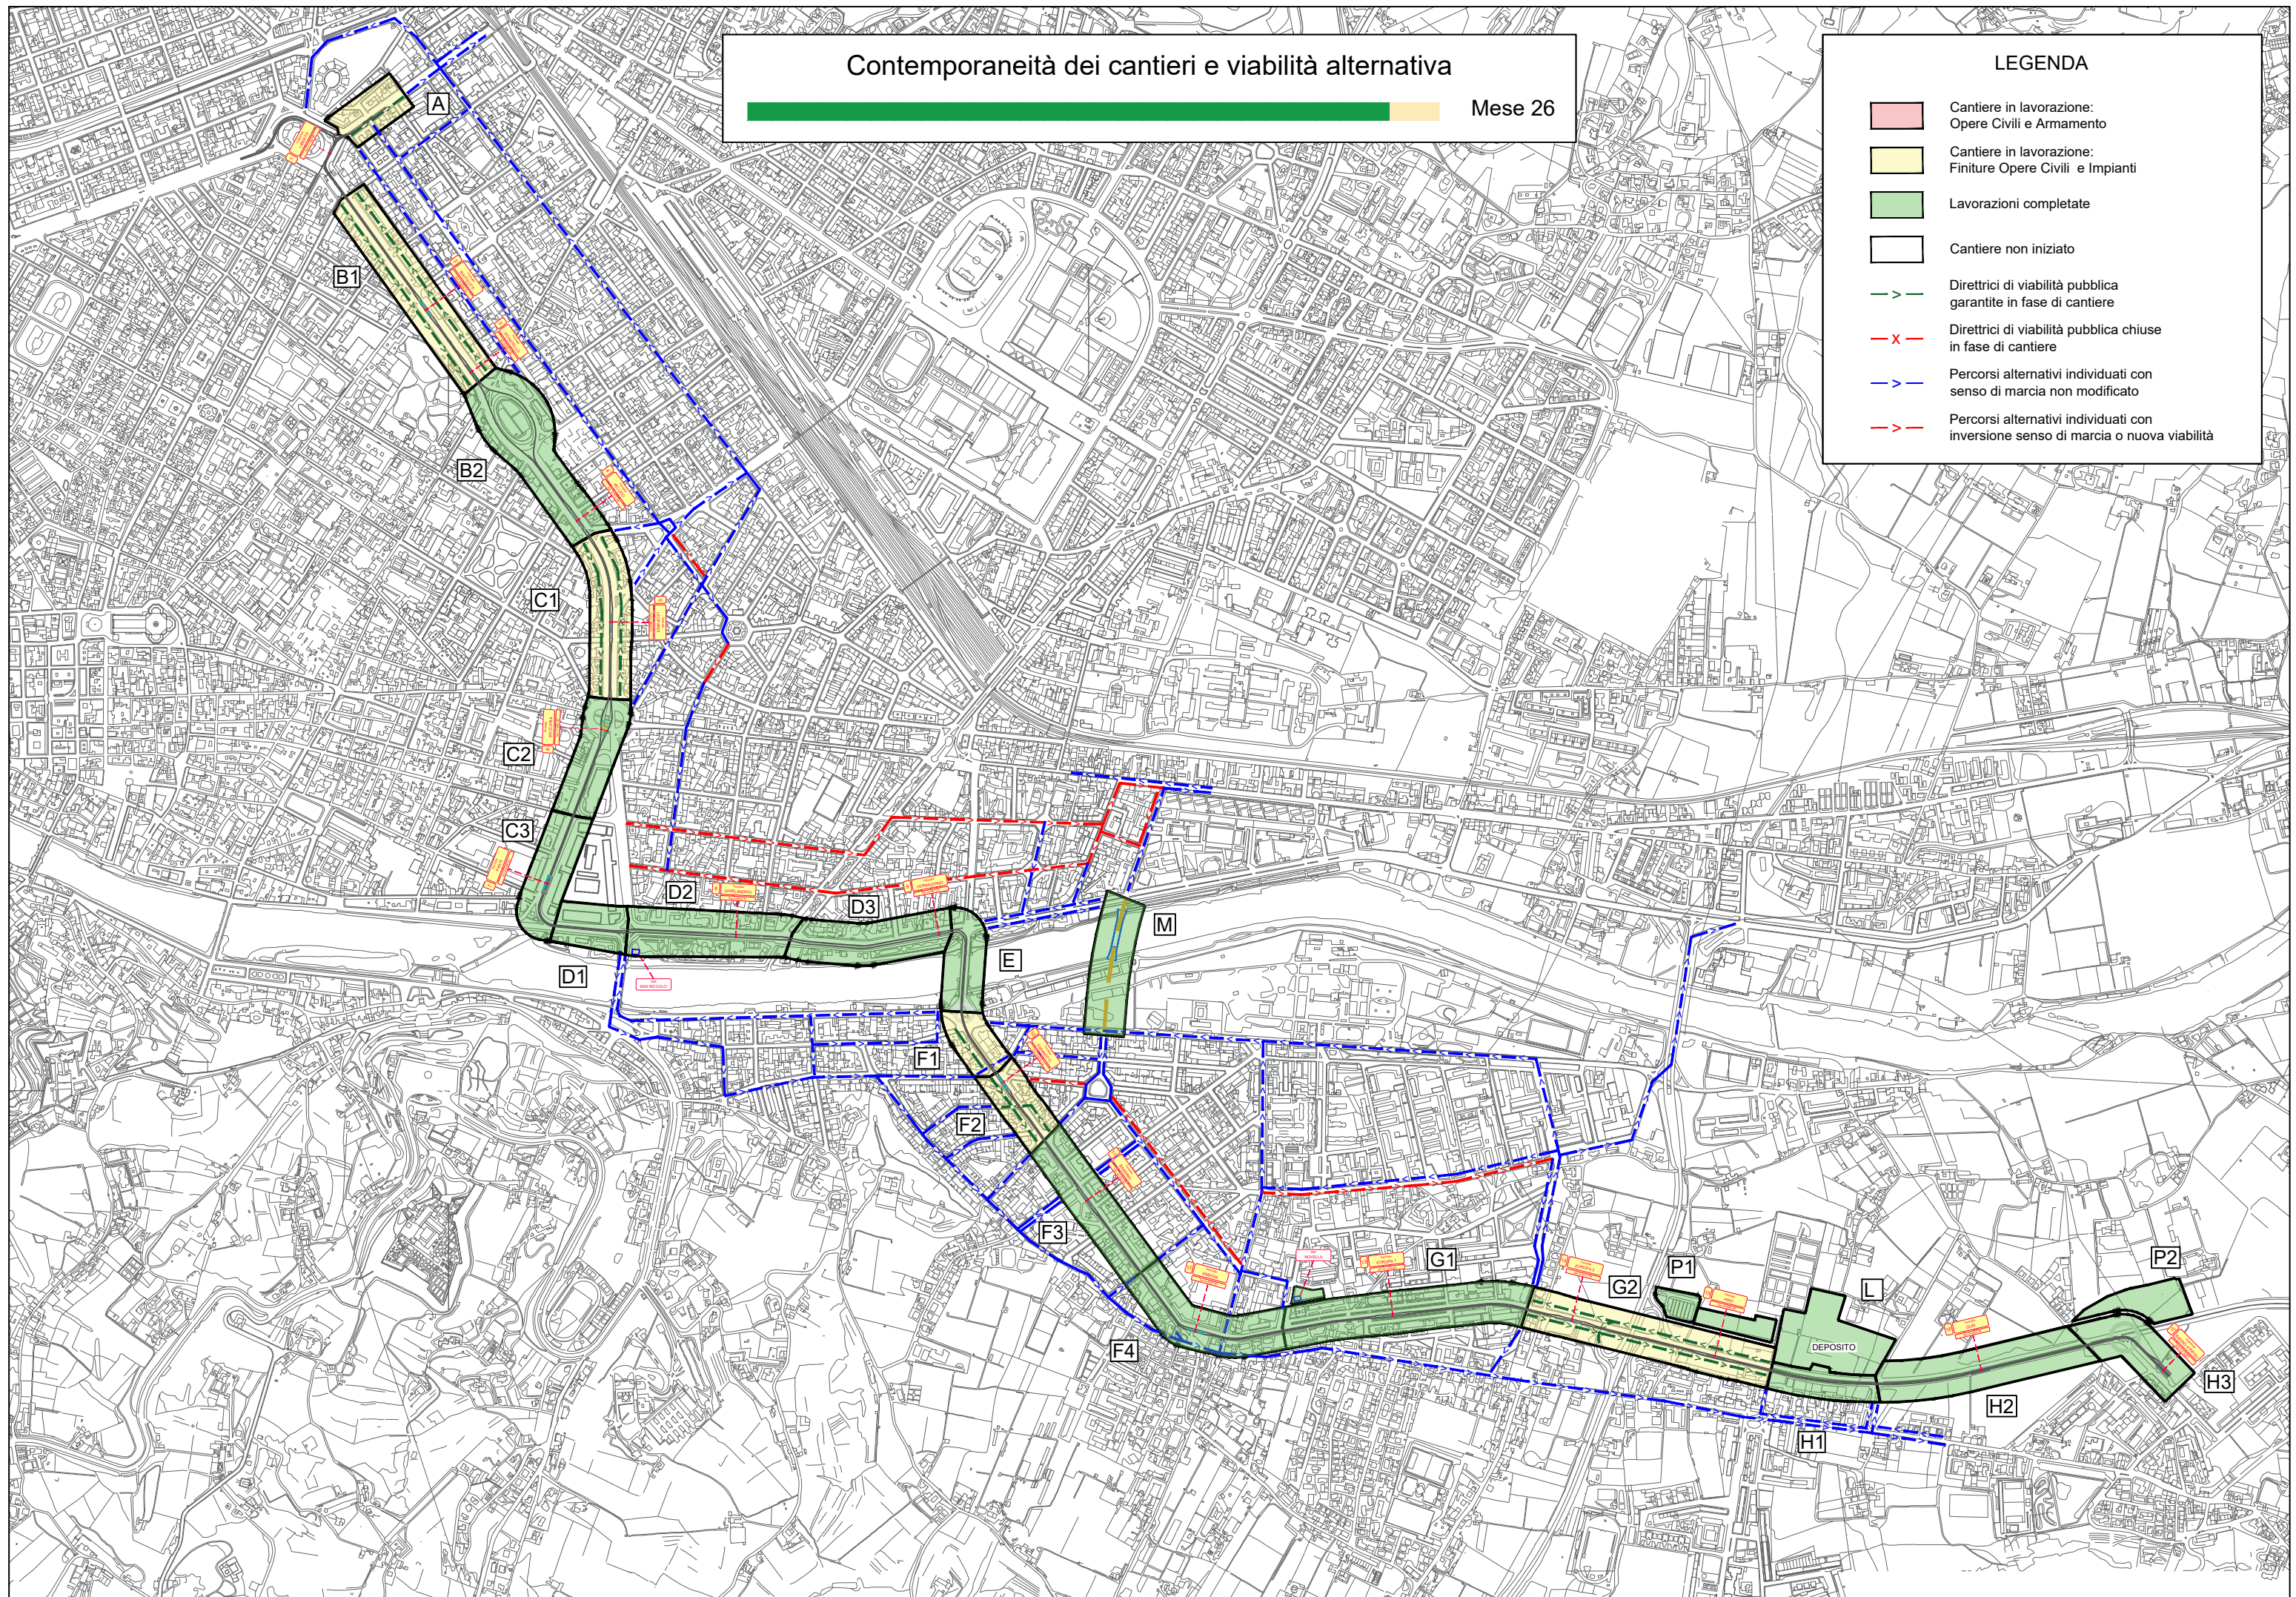


Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 27

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

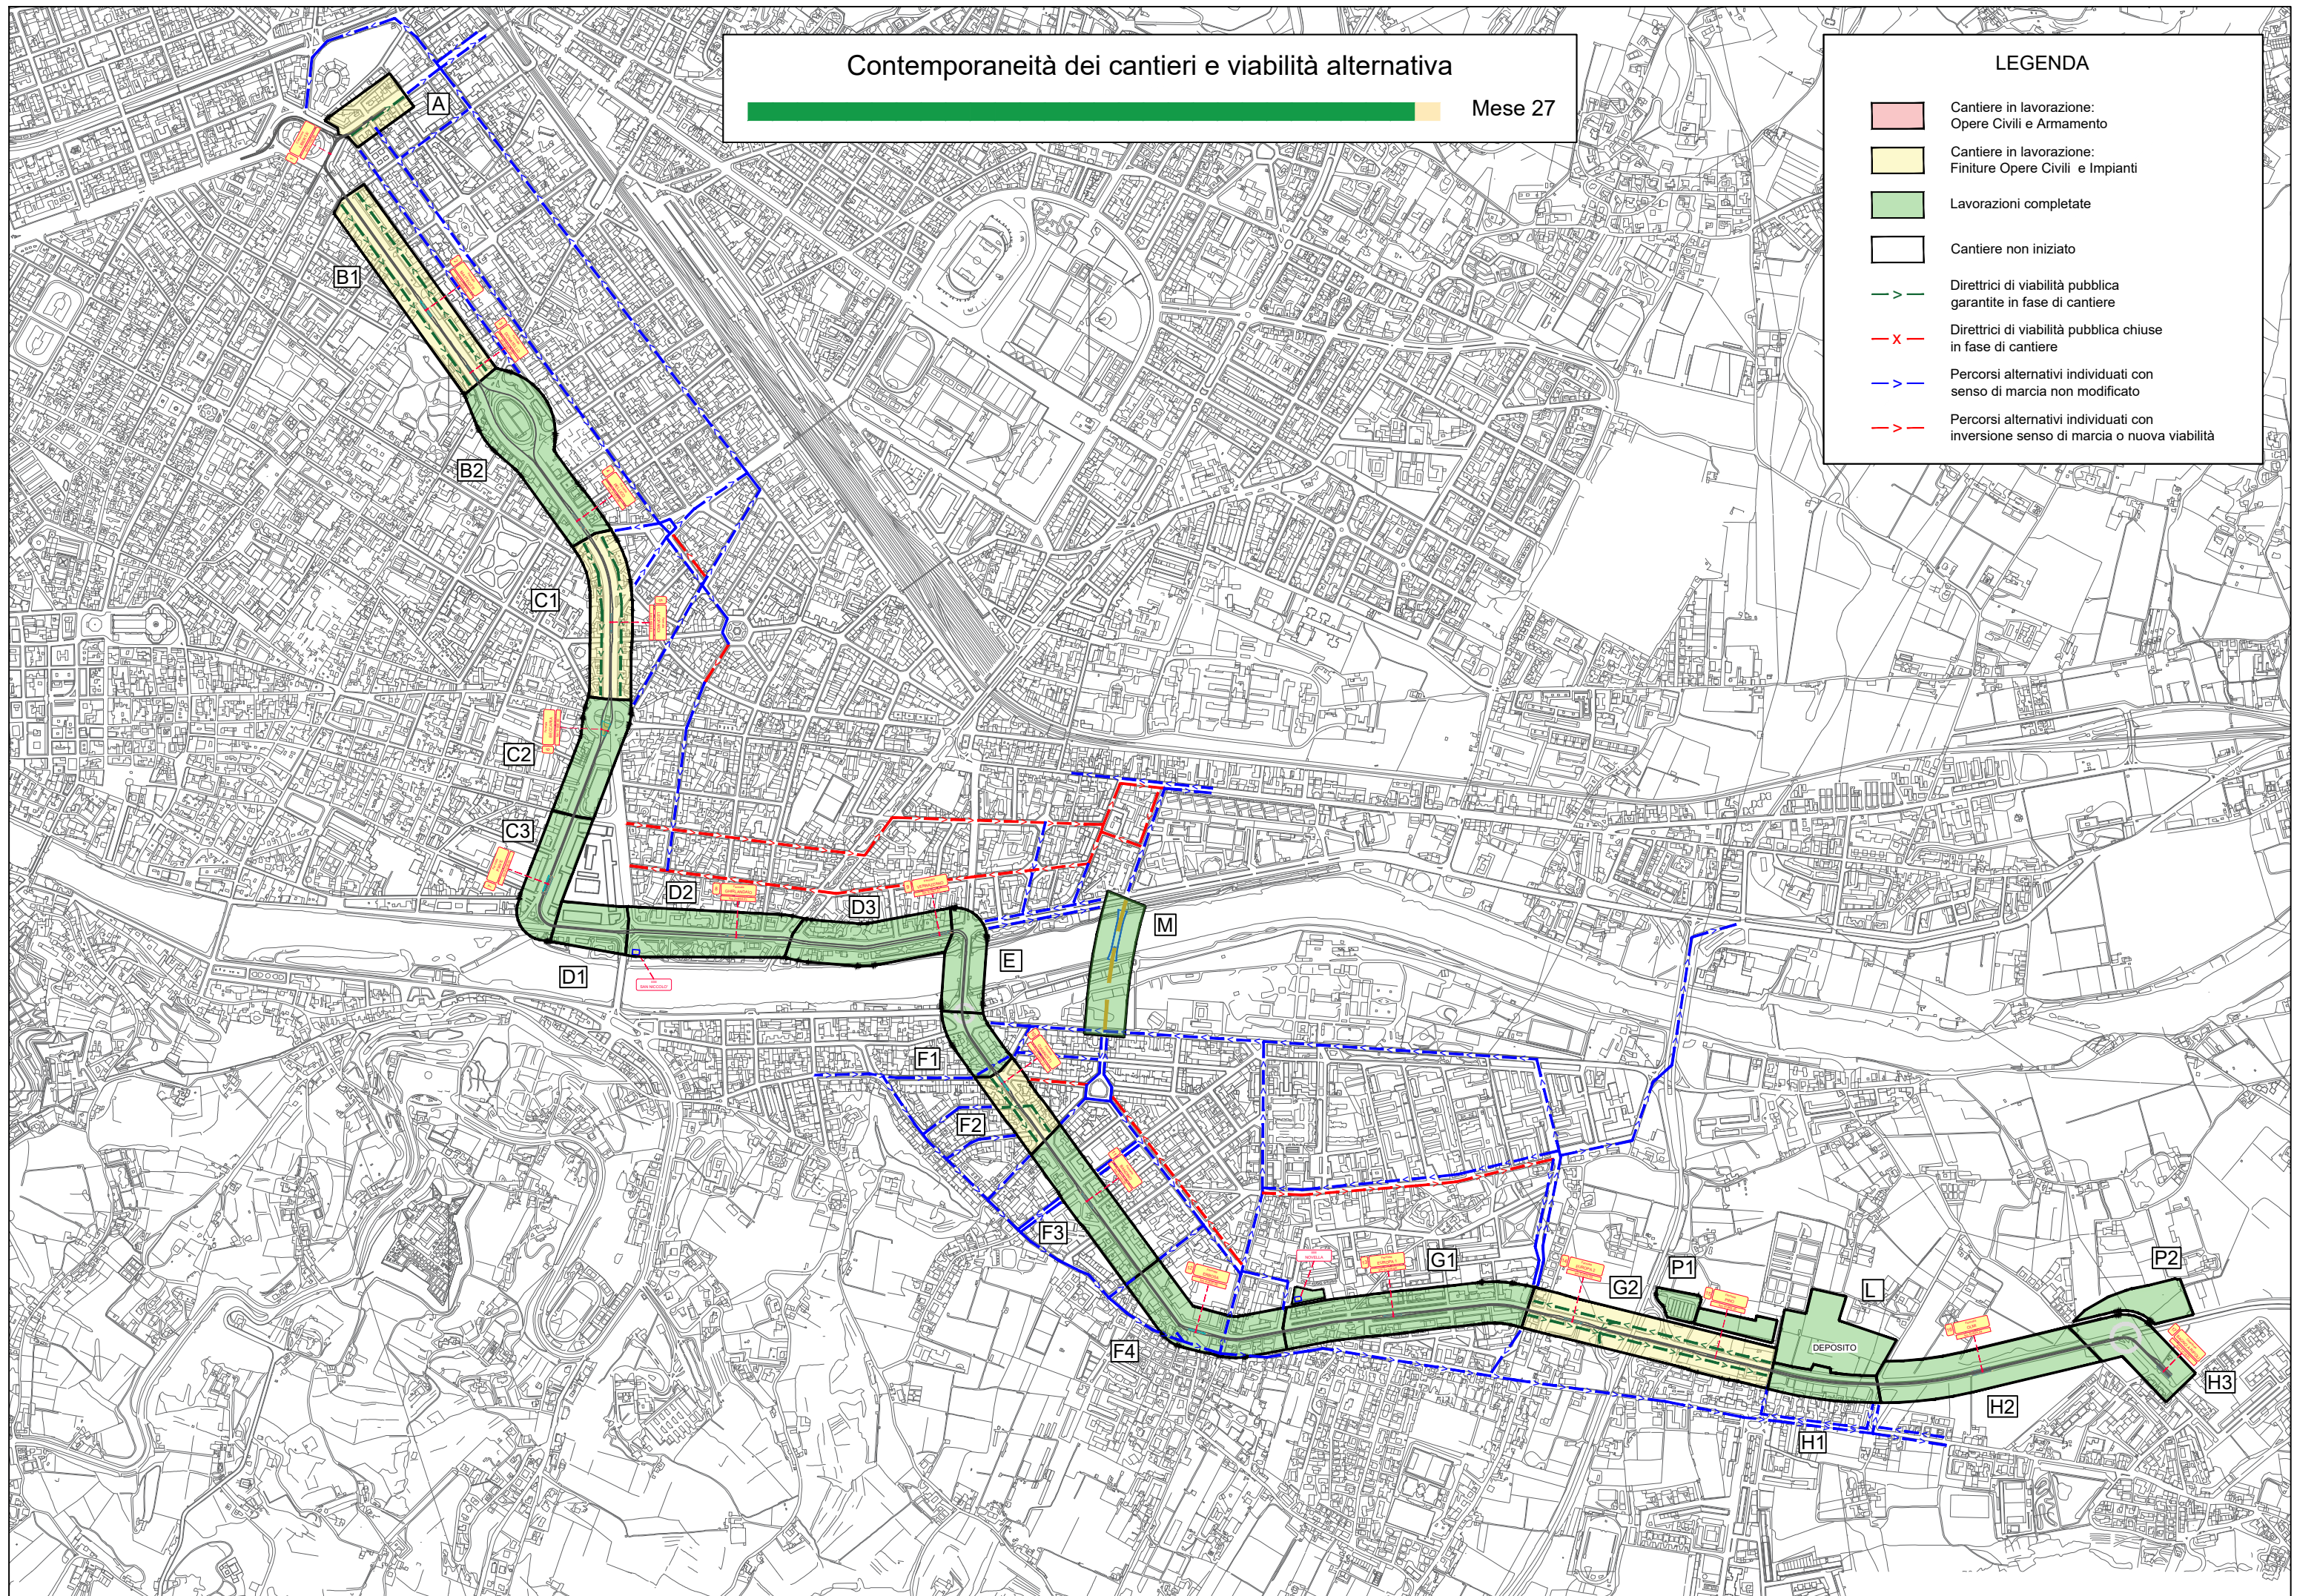

Contemporaneità dei cantieri e viabilità alternativa

Mese 28

LEGENDA

- Cantiere in lavorazione:
Opere Civili e Armamento
- Cantiere in lavorazione:
Finiture Opere Civili e Impianti
- Lavorazioni completate
- Cantiere non iniziato
- Direttrici di viabilità pubblica
garantite in fase di cantiere
- Direttrici di viabilità pubblica chiuse
in fase di cantiere
- Percorsi alternativi individuati con
senso di marcia non modificato
- Percorsi alternativi individuati con
inversione senso di marcia o nuova viabilità

